STADTBETRIEBE UNNA

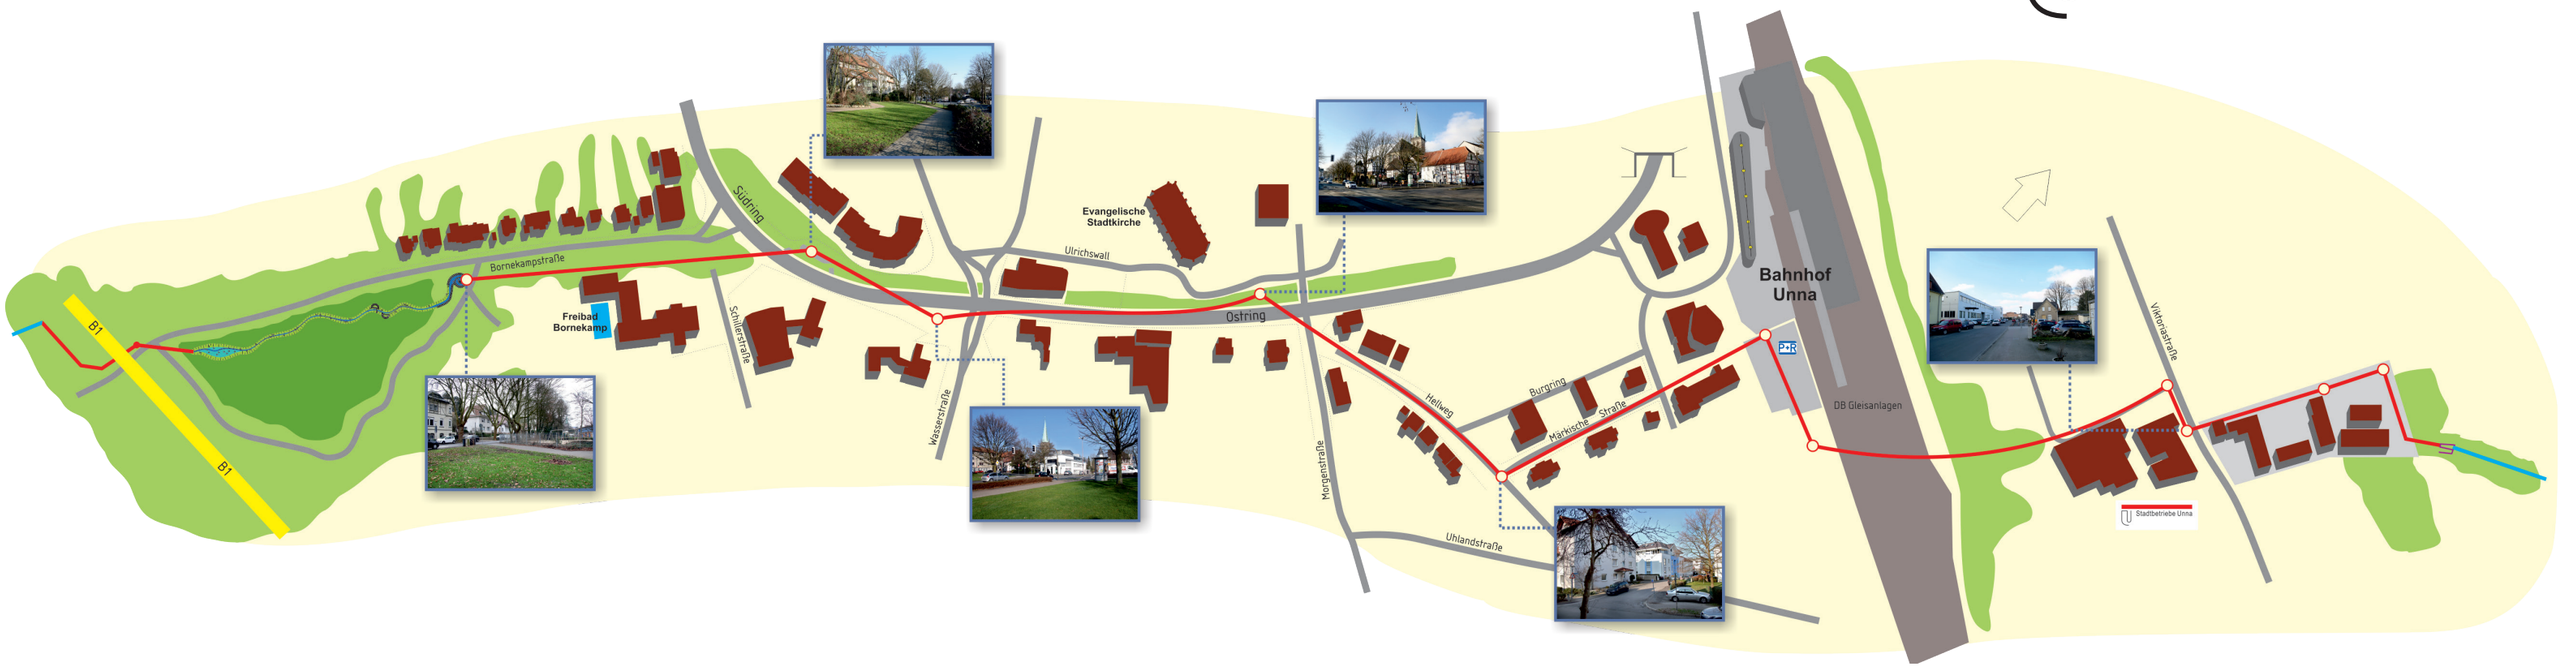

Erneuerung des Kortelbaches

Bürgerinformation Stand Januar 2018

In einem mehrjährigen Projekt bauen die Stadtbetriebe Unna zwischen der Viktoriastraße und dem Bornekamp einen neuen unterirdischen Gewässerlauf für den Kortelbach.

- Das im Oktober 2016 gestartete Projekt liegt voll im Zeitplan.
- Rund drei Viertel des insgesamt 1.700 Meter langen Rohrvortriebes sind geschafft.
- Die unterirdische Verrohrung zwischen Viktoriastraße und Morgenstraße ist erfolgt.
- Die großen Schachtbaugruben unterhalb des Ölckenthurms, an der Morgenstraße und an der Wasserstraße sind ausgehoben. Die letzte Schachtbaugrube im Bornekamp wird ab Februar erstellt.
- Drei Vortriebstrecken von der Morgenstraße bis zum Bornekamp sind noch zu erstellen. Details finden Sie auf der Rückseite.

Das Projekt:
Erneuerung des Kortelbaches – Mittellauf

Das Ziel:
Das Quellwasser des Kortelbaches vom Schmutzwasser zu trennen.

Planung: 2013 - 2015

Beginn: Oktober 2016

Bauzeit: drei Jahre

Baulänge: 2,15 Kilometer

Baukosten: ca. 6,75 Mill. €

Weitere Informationen unter:
www.stadtbetriebe-unna.de

Fragen?

Stadtbetriebe Unna
Projektbüro Kortelbach

Projektleiter: Thomas Matter
Viktoriastraße 12 • 59425 Unna

Telefon: 02303 2003-82
Telefax: 02303 2003-13

thomas.matter@stadtbetriebe-unna.de

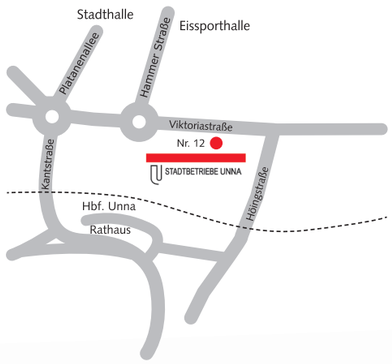

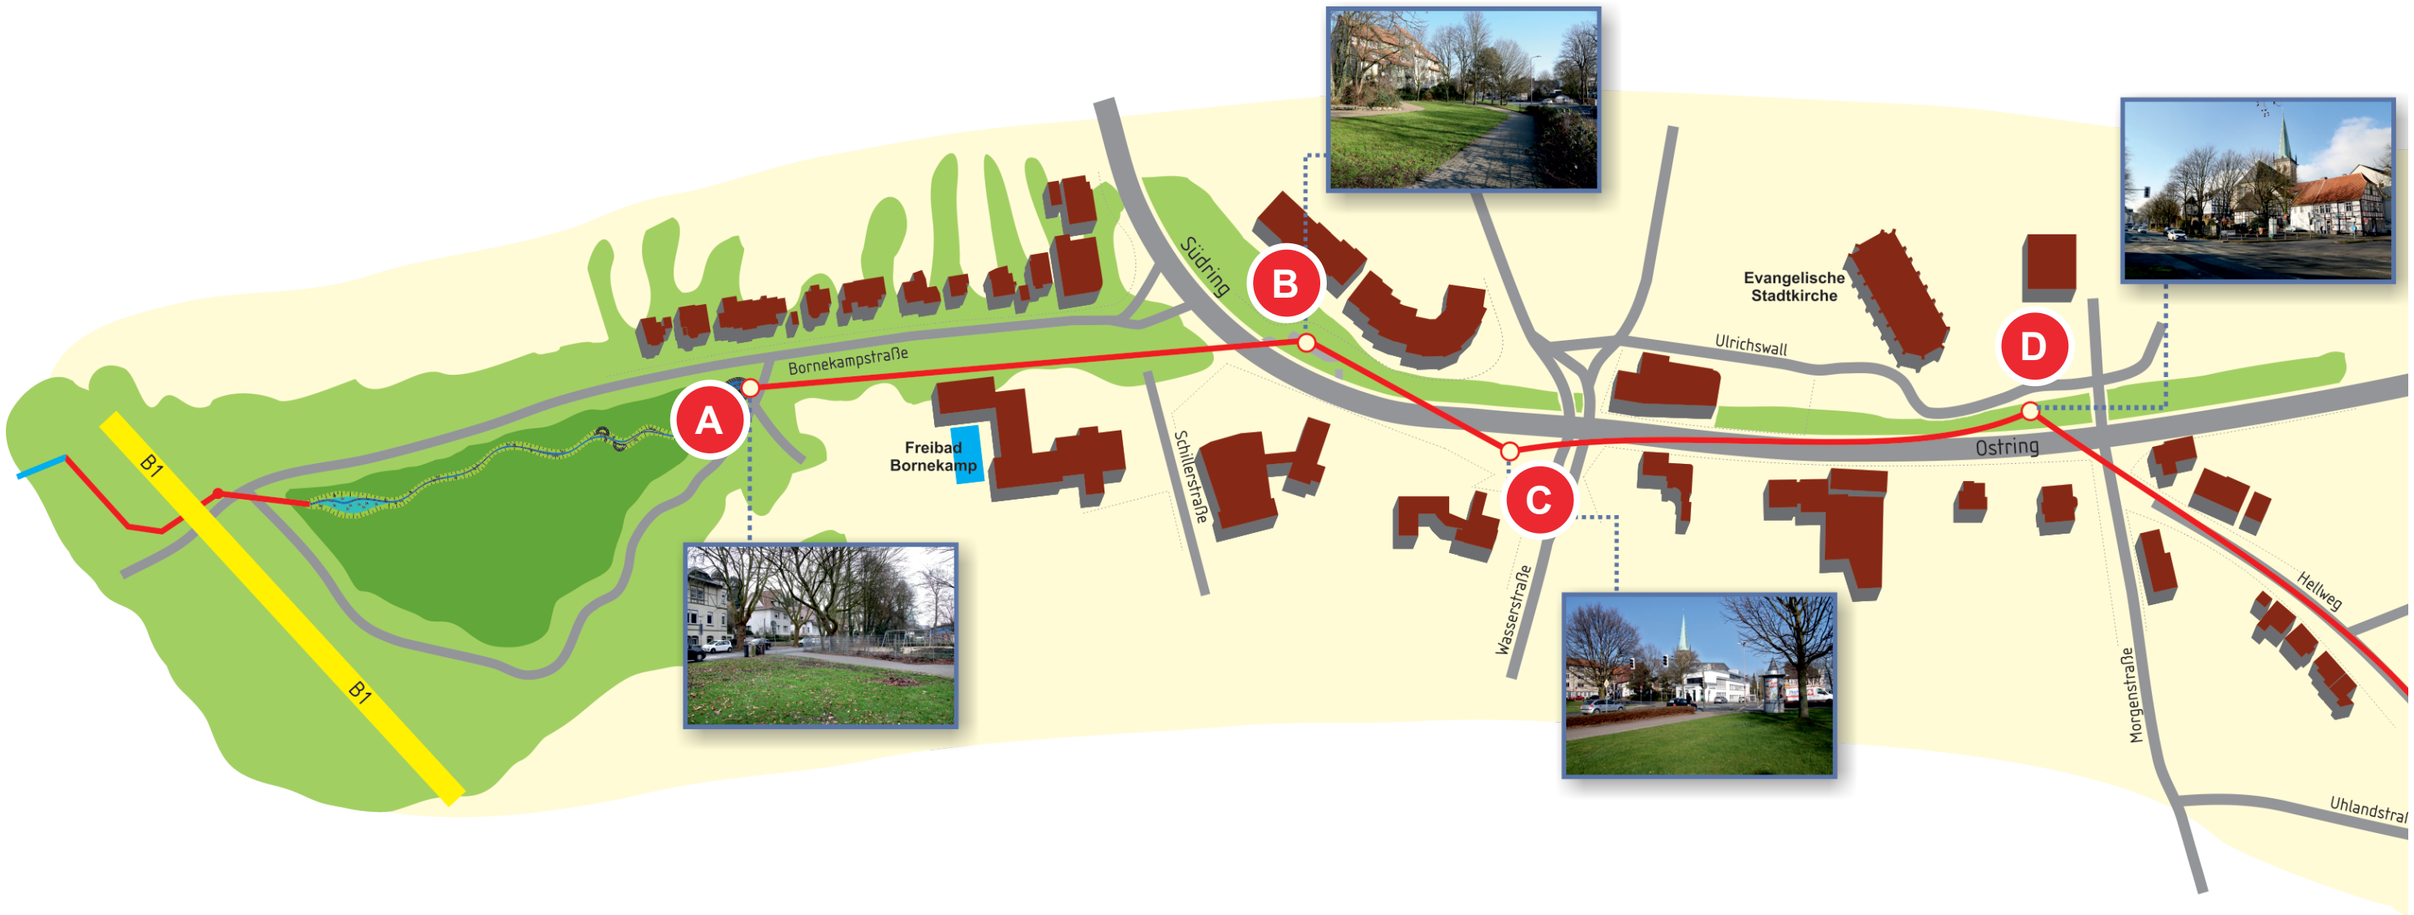

Die Baustellen und Schachtbaugruben für den Kortelbach

A Bornekamp

- Die Schachtbaugrube hinter dem Freibad Bornekamp wird ab Februar 2018 ausgehoben.
- Anschließend wird der unterirdische Rohrvortrieb vom Ölckenthurm zum Bornekamp erfolgen.
- Der Bau des offenen Bachlaufes in der Grünanlage parallel zur Bornekampstraße beginnt im Sommer 2018.

B Ölckenthurm

- Die Schachtbaugrube unterhalb des Ölckenthurms wurde **in 2017** ausgehoben.
- Von hier aus wird der unterirdische Rohrvortrieb in Richtung Wasserstraße und Bornekamp erfolgen.

C Wasserstraße | Südring

- Die Schachtbaugrube an der Einmündung der Wasserstraße in den Südring wurde zum Jahresende **2017** ausgehoben.
- Der Rohrvortrieb zu dieser Baugrube erfolgt von den Baugruben Ölckenthurm (B) und Morgenstraße (D).

D Morgenstraße

- Die Schachtbaugrube an der Einmündung Morgenstraße/ Ostring unterhalb des Morgentores wurde **2017** eingerichtet. Bis hierher ist bereits ab der Viktoriastraße der Vortrieb erfolgt.

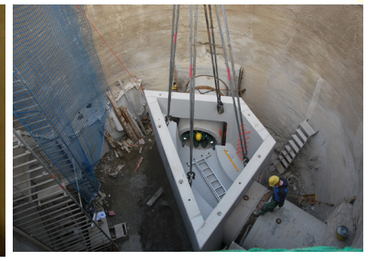

- **Alle Schachtbaugruben** werden nach Ende des Vortriebs mit großen Schachtbauwerken ausgestattet und anschließend verfüllt.

- **Alle Daten zur Gesamtbaumaßnahme** finden Sie unter www.stadtbetriebe-unna.de/gewaesser/kortelbach/

- **Bilder von den Vortriebsarbeiten** finden Sie unter: www.stadtbetriebe-unna.de/gewaesser/kortelbach/bilder-vom-projekt/
